

Q/ZGYY

郑州市轨道交通有限公司运营分公司企业标准

Q/ZGYY 00 GP 005-2015

新线介入管理程序

A/1

内部资料 严禁外传

2017 -07-06 发布

2017 - 07 - 10 实施

郑州市轨道交通有限公司运营分公司
发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 职责 2

5 管理内容及要求 3

6 报告和记录 10

附录 A（规范性附录） 新线会议反馈表..... 11

附录 B（规范性附录） 图纸资料审核意见汇总表..... 12

附录 C（规范性附录） 新线施工现场介入问题汇总表..... 13

附录 D（规范性附录） 施工现场介入计划..... 14

附录 E（规范性附录） 新线图纸和资料审核流程..... 15

附录 F（规范性附录） 新线现场介入流程..... 16

附录 G（规范性附录） 新线运营需求提报流程..... 17

附录 H（规范性附录） 新线介入现场需求提报情况说明..... 18

前 言

本标准规定了郑州市轨道交通有限公司运营分公司参与新线建设各个阶段的管理内容和要求。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司提出。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司新线部起草、解释。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司计划经营部组织汇审。

—本标准为第一次修订。

—本标准主要起草人：张红欣、张家涛、王乾坤、孟祥飞、李柯、郭义伟、高利贤、刘培阳

—本标准主要审核人：汪国利

—本标准主要签发人：刘宏泰



新线介入管理程序

1 范围

本标准明确了郑州市轨道交通有限公司运营分公司（以下简称分公司）介入新线建设各个阶段的管理内容和要求。

本标准适用于分公司在介入新线建设过程中的管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《郑州市轨道交通有限公司运营介入地铁工程建设实施办法》

《承包商安全管理办法》

《地铁运营事故（事件）调查处理规则》

3 术语和定义

3.1 新线介入

是指分公司介入郑州市轨道交通工程的规划、预备可行性研究报告（以下简称“预可研”）、工程可行性研究报告（以下简称“工可”）、设计文件、设备采购招标文件流转、土建施工、设备安装及调试直至开通试运营全过程等新线建设不同阶段所有工作的总称，主要包括新线图纸资料审核、技术文件审核、参加新线会议、施工现场介入、运营意见反馈、跟踪与落实等。

3.2 新线介入前期工作

是指分公司介入新线建设中的预可研、工可、设计文件、招标文件、设备系统招标、合同谈判、设计联络、设备系统出厂验收等工作。

3.3 新线介入后期工作

是指分公司介入新线建设中的土建工程、安装装修工程、系统设备安装工程、设备调试、工程验收等工作。

3.4 老员工

是指具备郑州市轨道交通新线介入后期工作实践经验的员工。

3.5 新员工

是指不具备郑州市轨道交通新线介入后期工作实践经验的员工。

3.6 现场介入计划

是指进驻前部门（中心）每月制定报新线部备案的介入时间和介入人数安排。

3.7 新线会议

是指分公司在新线介入过程中参加的所有会议，主要包括新线介入前期的设计协调会、设计审查会、设备技术规格审查会、设计联络会、技术研讨会以及新线介入后期的建设运营对接会、设备调试例会、施工现场会等。

3.8 新线施工现场介入

是指分公司在新线介入过程中，需进入新线施工现场跟进施工进度和工程质量，参加土建工程、安装装修工程、系统设备安装工程、系统调试、工程验收等工作的总称。

3.9 新线介入人员

是指分公司参与新线介入工作的所有人员总称，主要包括新线介入管理人员、图纸资料审核人员、参加新线会议人员、新线施工现场介入人员等。

3.10 新线图纸和资料

是指郑州市轨道交通有限公司(以下简称公司)下发的建设初期新线各阶段的设计图纸、设计文件、用户需求书、招标文件等。

3.11 需求部门

是指分公司的综合管理部、物资部、信息管理部、安全技术部、安保部、教育培训部、调度票务中心、乘务中心、站务中心、车辆中心、通号中心、供建中心、机电中心等部门。

4 职责

4.1 新线部

4.1.1 作为分公司新线介入工作归口管理部门。

4.1.2 负责分公司新线介入工作的总协调，负责对外联系和内部协调工作。

4.1.3 负责协调多部门(中心)之间难以自主协调解决的事宜。

4.1.4 负责配合教育培训部的培训工作，做好与公司机电设备部的对接工作。

4.2 调度票务中心、乘务中心、站务中心、车辆中心、通号中心、供建中心、机电中心、安保部、物资部、信息管理部

4.2.1 负责全过程参与新线设备的技术规格书审核、设备招标、合同谈判、设计联络、出厂验收等工作。

4.2.2 负责本部门(中心)新线介入人员的安管理工作。

4.2.3 负责本部门(中心)管理专业之间的协调事宜。

4.2.4 负责本部门为主导，需多部门(中心)配合、可协调解决的事宜。

4.2.5 负责配合非本部门为主导、需多部门(中心)协调解决的事宜。

4.3 教育培训部

4.3.1 负责做好新线设备供货商厂家培训和现场培训的管理工作。

4.3.2 负责本部门为主导、需多部门(中心)配合、可协调解决的事宜。

4.3.3 负责配合非本部门为主导、需多部门(中心)协调解决的事宜。

4.4 安全技术部

4.4.1 作为三全接管后新线介入安全的管理部门。

4.4.2 负责对三全接管后新线介入安全的管理和考核。

4.4.3 负责本部门为主导、需多部门(中心)配合、可协调解决的事宜。

4.4.4 负责配合非本部门为主导、需多部门(中心)协调解决的事宜。

4.5 综合管理部

4.5.1 作为办公系统 OA 的管理部门

4.5.2 负责工作联系单等正式文件的发送与接收工作。

4.5.3 负责本部门为主导，需多部门(中心)配合、可协调解决的事宜。

4.5.4 负责配合非本部门为主导，需多部门(中心)协调解决的事宜。

4.6 人力资源部

4.6.1 作为人员考勤的管理部门

4.6.2 负责对新线介入出勤情况的管理和考核。

5 管理内容及要求

分公司以新线部为总协调，各生产中心指定1名中心副主任，各室指定1名副主任（安全技术室作为中心唯一出口），分别负责本中心、本室的新线介入管理工作，并指定部门（中心）联络员和室联络员，职能部门指定1名副部长和1名新线联络员负责本部门的新线介入管理工作（部门设有二级室的，应增加1名副主任），形成分公司/部门（中心）/室三级新线介入管理网络，及时协调解决新线介入过程中所发现的各类问题。同时，各生产管理中心应建立中心内部新线介入管理网络。新线介入人员应保持相对稳定，必须专职负责。对于分公司新线介入网络人员变动的，应在2个工作日内报新线部备案。

5.1 新线会议

新线部应按公司、运营分公司要求，以及会议的实际情况，及时组织分公司相关部门参加新线会议，参会部门会后及时填写《新线会议反馈表》（见附录A），并按会议要求做好后续工作。具体要求如下：

5.1.1 对运营安全和使用功能造成重大影响的事项，应第一时间向分公司领导汇报，并按分公司领导的要求进行落实，同时反馈至新线部。

5.1.2 会议所布置的工作任务需分公司多个部门（中心）协调解决时，参会部门（中心）应及时提出，由新线部负责协调。

5.1.3 会议所决定的事项涉及分公司多个部门（中心）时，事项主办或主管部门（中心）应将相关内容通报至未参会的相关部门（中心）。

5.1.4 所有新线会议纪要应传阅至新线部、参会部门（中心）和相关部门（中心）。

5.1.5 参会部门（中心）于结束后2个工作日内，将本部门（中心）《新线会议反馈表》报新线部。

5.1.6 原则上新线专业技术类会议由相关生产中心参加，新线综合类会议由新线部和相关部门（中心）参加。

5.1.7 公司领导召集的新线会议原则上由分公司领导安排相关部门（中心）参会。其他新线会议则由新线部根据会议要求通知相关参会部门。

5.2 新线图纸和资料审核管理

5.2.1 新线图纸和资料审核流程（见附录E）

5.2.2 图纸和资料接收及归档管理

5.2.2.1 正常情况下，各阶段的送审稿资料由新线部根据公司相关部门（中心）的要求，及时到公司领取，并做好相应的接收、借阅、归还及档案归档工作。

5.2.2.2 特殊情况下，分公司参会人员领到图纸资料后，应尽快将图纸资料送到新线部，以便于及时组织相关专业人员进行审核。

5.2.2.3 经办公系统OA流转的新线文件由分公司综合管理部归口管理，按OA系统规定进行接收、发放。

5.2.2.4 新线图纸和资料属保密文件，在运营流转时，严禁外传。

5.2.3 图纸和资料审核

5.2.3.1 新线部收到新线图纸和资料审核任务后，依据实际情况，采用集中审核、分散审核或二者结合的方式，组织相关部门（中心）进行新线图纸和资料审核。

5.2.3.2 图纸和资料审核部门（中心）领取图纸和资料后，2个工作日内及时组织本部门（中心）相关专业人员开展图纸和资料审核工作。

5.2.3.3 新线图纸和资料审核重点

结合线网规划与建设规划情况，对新建和拟建线路的新线图纸和资料进行研究，提出运营的需求。

a) 工程可行性研究报告阶段：

对网络化运营项目的统筹；对资源共享的方案；对新建和拟建线路技术标准、设备系统制式、运行交路、配线设置方案、车辆基地功能与配置等方面提出运营建议。

b) 初步设计阶段：

对各专业设计的技术要求；设备用房、管理用房、工区用房、特定功能用房（如档案、展陈及培训等）的配置标准及要求；车辆基地的工艺设备配置需求；相关既有车站、车辆基地、主变电站、控制中心的改造要求；换乘站换乘流线及车站布局原则等方面提出运营建议。

c) 施工图设计阶段：

对初设阶段用户需求的深化、细化、量化技术文件和资料；公共区与设备区的具体布置；结合设备系统设计联络的开展确定的细节需求；对轨道标识、导向标识以及设备用房标识系统的具体要求等方面提出运营建议。

d) 招标及用户需求书阶段：

依据设计文件、设计规范、公司、分公司相关会议纪要、运营需求技术文件等正式文件材料对需求书的技术标准、设施设备配置、布局进行重点审核；以及对招标的范围、技术要求、备品备件、质保期等方面进行重点研究，并提出运营建议。

5.2.3.4 审核意见的描述和等级划分：

- a) 表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。该意见级别列为 A 级。未按设计规范设计、不符合设计规范、不符合用户需求等均属于 A 级。
- b) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。该意见级别列为 B 级。
- c) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。该意见级别列为 C 级。
- d) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：采用“可”。该意见级别列为 C 级。
- e) 应按有关标准、规范执行的用词：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

5.2.4 意见的收集与反馈

5.2.4.1 图纸资料审核人员按要求填写《图纸资料审核意见汇总表》（附录 B），及时将审核意见提交给本室新线联络员。室内部各专业之间的审核意见有分歧时，经室协调后，由室新线联络员将本室统一后的意见提交部门新线联络员。

5.2.4.2 当本部门（中心）内部各室之间的审核意见有分歧时，经部门（中心）协调后，由部门（中心）新线联络员将本部门（中心）统一后的意见反馈到新线部。各中心意见必须在 OA 系统内反馈，必要时以纸质版（部门/中心盖章）反馈至新线部。

5.2.4.3 正常情况下，图纸资料审核部门（中心）的新线联络员原则上应在接收到图纸资料后 3 个工作日内，将本部门（中心）的审核意见反馈到新线部。遇特殊情况，新线部可根据实际情况适当调整审图意见反馈时间。

5.2.4.4 新线部收到各部门（中心）的审核意见后，应及时汇总和审核，对各部门（中心）之间的不同意见进行协调，形成分公司统一意见后，以工作联系单的形式向公司相关部门（中心）反馈。

5.2.4.5 图纸资料审核过程中，如遇重大技术问题，运营分公司需求部门应与公司相关部门或设计单位进行沟通协商，相关部门应在审核意见中明确协商结果；视协调结果，新线部负责持续跟踪联系，同时根据实际需要适时召开专项技术会议并报分公司领导。

5.2.5 运营意见跟踪与核实

5.2.5.1 新线部负责图纸资料审核意见的回复跟踪，及时将设计单位的回复意见反馈至相关部门。

5.2.5.2 图纸资料审核部门（中心）收到设计单位的回复意见后，应全面核实设计单位回复的意见是否满足运营要求。满足运营要求或者对回复无异议的，应在后续工作中严格落实执行；未满足运营要求且自行沟通无效的，应在2个工作日内向新线部提出，由新线部统一向公司相关部门反馈。

5.2.5.3 新线前期工作各类会议是落实运营意见的重要途径，原则上谁审核谁参会，且参会人员对于会议讨论事项具备决定权或在会议期间请示后反馈结果。

5.2.5.4 为确保审图意见前后一致，以及便于核实运营意见是否落实到图纸资料中，要求谁提问题谁核实，谁提问题谁跟踪，若所提问题影响运营或涉及多个部门（中心），经自行沟通无效的，由新线部统一牵头解决。

5.2.5.5 图纸资料审核过程中，如遇跨部门的问题，由问题提出部门和该设备管理部门共同协商处理。

5.2.5.6 审图人员应将设计单位承诺在下阶段设计中落实的问题，作为在下阶段图纸资料审核的重点。遇到设计单位对所提的问题未按回复意见给予落实时，问题提出部门应核实该问题是否需再次提出，确实需要再次提出时，应注明该意见属第二次提出，以引起设计单位的重视。

5.2.5.7 各部门（中心）应对新线图纸资料审核意见进行分类归档，并建立相应台帐制度，以便于运营意见的跟踪与追溯。

5.2.5.8 特殊情况下，各部门收到公司相关部门给予的回复意见时，应反馈至新线部。

5.3 新线现场介入管理

5.3.1 新线现场介入流程（附录F）

5.3.2 基本要求

5.3.2.1 各部门（中心）按本管理程序相关要求分线别编制现场介入实施方案。

5.3.2.2 分公司新线现场介入以车站房建结构、设备安装、装饰装修、设备系统调试和联调为切入点，正线以标段为单位，车辆段以场段为单位，根据施工进度分阶段、分批次逐步增加运营筹备力量。

5.3.2.3 新线施工现场介入人员必须严格遵守公司、分公司轨行区管理办法和分公司《承包商安全管理办法》规定。

5.3.2.4 不得安排未经过三级安全教育的员工到新线施工现场参观学习。

5.3.2.5 每次现场介入人数应不少于2人且介入过程中禁止单独行动，各部门（中心）应选择业务精、责任心强、熟悉现场的人员担任现场介入的负责人和安全负责人，并按本办法相关规定，提前做好现场介入人员的安全教育、现场介入申请和审批等工作，严格执行同去同回的原则。

5.3.2.6 现场介入过程中，应注意现场成品保护，服从属地承包商和监理的管理，时刻留意现场情况，确保人身和设备安全。

5.3.2.7 现场介入工作结束后，现场介入负责人及时办理相关出清手续。

5.3.2.8 现场介入主要人员应有新线介入经验的技术骨干人员，要求相对固定，以保证现场介入工作的可持续性和连贯性。

5.3.2.9 现场介入人员应按本部门（中心）提交至新线部备案的《施工现场介入计划》（附录D）按时、按量完成现场介入工作任务。

5.3.3 施工现场会议管理

5.3.3.1 供电、接触网、轨道、结构、弱电系统（含 AFC 系统）、装修、车辆及其相关设备等专业的施工现场例会，由相关部门（中心）安排人员参会，并提出本部门（中心）专业意见，将会议情况反馈至新线部，并对问题进行跟踪，落实整改。

5.3.3.2 施工工程例会由新线部通知，相关部门（中心）室副主任或以上人员参会，提出本部门（中心）专业意见，将会议情况反馈至新线部，并对问题进行跟踪，落实整改。

5.3.3.3 建设运营对接会，由新线部组织运营分公司相关部门（中心）负责人或分管新线副职参会，并提出本部门（中心）专业问题，根据对接会情况，对问题进行跟踪、落实整改。

5.3.4 现场问题管理

5.3.4.1 问题分级定义

新线现场介入人员在现场介入过程中,对所发现的问题按性质分为 A、B、C 三个等级，并提出运营处理意见和建议。A、B、C 三个等级的具体含义如下：

A 类：影响行车、危及安全或存在重大安全隐患的问题；具体内容包含但不限于以下内容：

- a) 设计不符合规范，影响使用的；
- b) 未按设计图纸施工，造成设备设施无法使用的；
- c) 施工造成的设备设施缺陷，影响行车安全的；
- d) 现场施工存在危及行车设备安全的，存在较大安全隐患的；
- e) 公共区、人员办公区装饰装修存在危及人身安全的；
- f) 使用过程危及操作者人身安全的；
- g) 因施工原因造成重大质量问题的。

B 类：影响设备功能实现的问题；具体内容包含但不限于以下内容：

- a) 设计符合规范，影响使用的；
- b) 未按设计图纸施工，造成设备设施使用不便的；
- c) 未按设计图纸施工，造成设备设施检修不便的；
- d) 现场施工存在影响设备使用、功能实现的；
- e) 现场施工存在无法进行后期检修的；
- f) 公共区装饰装修存在不能实现客运服务功能的；
- g) 施工造成的设备设施性能不满足使用要求的；
- h) 违反专业安装规范，造成设备设施存在安全隐患的；
- i) 施工原因造成影响人员办公的；
- j) 施工工艺原因，存在设备损坏隐患的。

C 类：主要是对运营服务长期有影响或对用户使用有影响的问题（A、B 类以外的问题）。

5.3.4.2 问题库编制要求

- a) 各专业单独列表，按“字母+流水数字”的方式命名问题代码，字母代表相关专业或部门；数字为相关专业或部门问题顺序号（字母含义：AFC-自动售检票系统；BP-变配电；FJ-房建结构；FS-风水电；GD-轨道；JC-接触网；PT-屏梯；TX-通信；XH-信号；ZD-自动化；DP-调度票务中心；CW-乘务中心；ZW-站务中心；CL-车辆中心；QT-其它专业或部门）。
- b) 各专业问题一旦发现确认，须命名唯一问题代码，此代码一经命名不得变更。
- c) 各专业发现其他专业问题应立即将问题通报所属专业，由所属专业命名问题代码,将问题提交相关单位处理，以所属专业为主，双方同时跟踪解决。

- d) 问题库中检查人一栏填写不超过两名问题提出人的姓名、联系电话；整改情况一栏只能填写未整改、已整改、已销项三种状态。已销项问题主要是指经确认无法整改、无需整改或经问题提出部门负责人同意不整改的问题。
- e) 设计中未体现且不违反设计规范的需求类问题不纳入现场介入问题库管理。

5.3.4.3 问题反馈

- a) 现场介入人员在施工现场发现问题后，立即向现场监理单位、建设部门的业主代表反映，要求相关监理单位督促施工单位按照运营介入人员的意见进行整改；对于现场不能立即整改的问题，按要求填写《新线施工现场问题汇总表》（附录 C）纳入线路运营介入问题库，提交给本室新线联络员。
- b) 室新线联络员收集问题，与建设部门业主代表、监理单位对接并要求整改；对于本室对接后无法整改的问题提交部门（中心）新线联络员。
- c) 部门（中心）新线联络员收集本部门（中心）问题，与建设管理部门对接并要求整改；对于部门（中心）对接后无法整改的问题，经部门（中心）负责人审核后，将问题及对接结果报新线部。
- d) 新线部收集汇总各部门（中心）问题，与建设管理部门进行对接后，分专业、分系统整理，定期向公司建设管理部门发工联单或提交建设运营对接会协调解决。
- e) 运营建设对接会协调未果的问题，运营以专题报告形式向公司领导报告，由公司领导研究决定或由公司领导主持的建设运营对接会研究决定。

5.3.4.4 问题跟踪及销项

- a) 运营现场介入过程中发现的问题本着“谁管理、谁跟踪”的原则，各现场介入人员发现本专业问题分层次协调相关单位整改解决；发现非本专业问题时将问题通报至所属专业，以所属专业为主，双方同时跟踪解决。
- b) 问题处理过程中总体遵循分层协调、逐级上报原则。各专业人员主动工作，逐级协调解决，禁止越级申报。
- c) 所有现场介入问题整改完成，经监理单位、公司建设主管确认后，分公司组织问题所属专业人员现场核查确认销项。
- d) 整改完成的现场介入问题在申请销项时，现场介入人员应及时安排核查予以销项，避免问题积压。三权移交、试运行、开通试运营等重大运营筹备节点前，各专业应安排集中整改销项。
- e) 现场介入问题在三权移交未完成整改销项时，列入三权移交接管备忘录作为遗留问题。
- f) 三权移交前，各专业对已完成整改的现场介入问题核销率不得低于 90%。

5.3.5 现场介入安全管理

5.3.5.1 现场介入前，各部门（中心）应做好以下工作：

- a) 各部门（中心）应尽可能选择技术熟练，对车站、轨行区等情况比较熟悉的人员进行现场情况通报。
- b) 每次现场介入必须指定人员担任现场介入负责人和安全负责人。
- c) 对现场介入人员进行施工现场安全注意事项的专题安全教育。
- d) 新线施工现场介入安全注意事项必须列入室级安全教育内容。
- e) 严禁在没有老员工的情况下，安排新员工进入新线施工现场。
- f) 主动与负责施工现场区域的业主代表、承包商、监理人员等联系，确认现场情况适合介入人员进入。

- g) 安全负责人出发前应做好同行人员的安全教育,做到人人知晓现场存在的危险因素和采取的防范措施。
- 5.3.5.2 进入施工区域前,应做好以下工作:
- a) 现场介入人员不得穿普通生活类鞋、背心、裙子、短腿裤等进入施工现场。
 - b) 安全负责人凭个人员工卡和轨行区施工作业令等与属地承包商办理进入施工区域的登记手续,并了解施工现场的现状和安全注意事项。再次确认现场情况适合介入人员进入时,方可进入。必要时可请求承包商、监理人员带领。
 - c) 进入施工现场必须戴安全帽,穿劳保鞋。进入轨行区必须穿着荧光衣,进入光线不明亮的场地,必须随身携带照明工具。
 - d) 安全负责人在进入施工现场前,负责清点人数,检查随行人员的劳防用品(安全帽、荧光衣、防砸鞋等)穿戴是否正确,照明工具等相关备品是否齐全,将施工现场情况传达至每一位随行人员。
- 5.3.5.3 在施工现场作业过程中的安全事项。
- a) 在介入施工现场作业过程中,应注意成品保护。
 - b) 不得单独行动,擅自离开随行队伍。
 - c) 行进中应注意避开坑、沟、孔洞、脚手架等,不得攀爬、跳跃、抛物,以免发生滑跌、踩空、碰撞等危险。密切注意施工现场的临时电源线,防止触电。
 - d) 不得触摸、擅自挪动施工人员使用的梯子、电闸、阀门、开关等施工设备,不得使用施工现场的设备设施。
 - e) 严禁在施工现场吸烟。
 - f) 施工现场有起重机作业时,须远离起重、吊装作业,不得在吊臂下或吊件、起重臂作业范围内站立、行走或观看作业。
 - g) 进入轨行区时,还应注意以下事项:
 - 1) 一切行动听从承包商指挥,注意防护人员所发信号。
 - 2) 未经授权不得登乘工程机车、轨道车。随作业车运行时,须注意放置的材料和工具是否已采取应有的防止脱落的安全措施,在车辆未完全停稳时,严禁上下车。
 - 3) 不得在地铁限界以内地方坐、卧、休息。
 - 4) 不得在钢轨和道岔尖轨上行走。
 - 5) 未经允许不得撤除车辆的防溜措施。
 - 6) 严禁使用道床或钢轨做垫板,在上面进行剧烈击打。
 - 7) 禁止坐在车顶上、作业平台或装载的货物上。
 - 8) 接触网带电后,作业人员所携带的所有物件必须与其保持规定的安全距离。严禁在未停电的情况下使用超长物件。
- 5.3.5.4 出清施工现场后应做好以下工作:
- a) 出清施工现场后,安全负责人应第一时间清点人数,确认随行人员全部出清。
 - b) 及时与属地承包商办理施工销点手续。
 - c) 安全负责人须将人员返回情况通知室安全员。
- 5.3.5.5 进入非轨行区区域的,由组织部门(中心)告知公司相应的建设管理部门及现场管理参建单位,征得其同意后,办理相关手续后方可进入。

5.3.5.6 进入轨行区区域的，按轨行区管理单位轨行区管理办法的相关规定，由介入部门（中心）通过公司建设部门向轨行区管理调度室申请办理（原则上在分公司未接管轨行区前，不得以分公司名义独自申请轨行区作业计划）。

5.3.5.7 现场介入人员在作业过程如发生人身伤害等意外事件，应立即按《地铁运营事故（事件）调查处理规则》及相关制度进行报告。

5.3.6 新线现场介入需求类问题管理

5.3.6.1 新线现场介入需求类问题提报流程（附录 G）

5.3.6.2 运营需求部门从使用、安全、维护及管理角度，收集新线现场介入中与设计有直接关系的需求问题，经室、部门（中心）讨论后形成统一意见；

5.3.6.3 运营需求部门提报的运营需求涉及运营其他部门的，必须与运营相关部门达成一致意见，并与公司相关部门进行沟通并达成一致意见，运营需求提报部门发起部门工联单报新线部，填写《新线介入现场需求提报情况说明》（附录 H）作为工联单附件。

5.3.6.4 新线部受理需求部门的现场需求时，应充分了解需求的内容和背景，核实需求部门与分公司关联部门、公司相关部门的沟通情况，当受理的需求提报被分公司关联部门、公司相关部门采纳，则由新线部发起工联单报公司相关部门，否则予以驳回。

5.3.6.5 新线部收到公司相关部门对运营现场介入需求类问题的相关意见回复后，负责将意见回复至相关需求部门确认。

5.3.7 新线介入考核管理

5.3.7.1 新线介入工作是各部门（中心）的职责之一，本部门（中心）的新线介入工作情况将按分公司《新线筹备管理考核实施细则》列入本部门的月度考核。

5.3.7.2 新线介入过程中，发生责任安全问题的，由安全技术部按有关规定进行考核。

5.3.7.3 新线介入过程中，发生重大技术问题，由安全技术部按有关规定进行考核。

5.3.7.4 新线介入过程中，有关人员违反考勤管理制度、持证上岗制度和人员培训制度的，由人力资源部、教育培训部按有关规定进行考核。

5.3.7.5 对新线介入过程中表现突出的部门（中心）和个人，如受到公司或分公司表扬的（以会议纪要为准），将按分公司《日常考核管理办法》加分奖励。

6 报告和记录

本标准所形成的报告和记录的要求见下表。

序号	记录名称	记录编号	保存期限	保存部门
1	新线会议反馈表	Q/ZGYY 00 GP 005-01	十年	新线部
2	图纸资料审核意见汇总表	Q/ZGYY 00 GP 005-02	十年	新线部
3	新线施工现场介入问题汇总表	Q/ZGYY 00 GP 005-03	三年	新线部
4	施工现场介入计划	Q/ZGYY 00 GP 005-04	半年	新线部
5	新线图纸资料 and 资料审核流程	Q/ZGYY 00 GP 005-05	三年	新线部
6	新线现场介入流程	Q/ZGYY 00 GP 005-06	三年	新线部
7	新线现场介入需求类问题提报流程	Q/ZGYY 00 GP 005-07	三年	新线部
8	新线介入现场需求提报情况说明	Q/ZGYY 00 GP 005-08	三年	新线部

附 录 A
(规范性附录)
新线会议反馈表

Q/ZGYY 00 GP 005-01

部/中心新线会议反馈表

序号	日期	时间	会议名称	主持人	会议主要内容	运营参会 部门和人员	本部门提出的意 见	会议情况			问题落 实情况
								会议决定与 运营相关事 项	会后需运 营协调事 项	其他有关 重要事项	

填报人：

填报日期：

部门负责人：

附 录 B
(规范性附录)
图纸资料审核意见汇总表

Q/ZGYY 00 GP 005-02

部/中心图纸资料审核意见汇总表

新线文件名称： 填报时间： 年 月 日 填报人：

序号	所属专业	章节序号/图号	原文内容	审核意见	问题级别	审核依据	审核部门	审核人	与相关部门/中心沟通情况	备 注
1										
2										
3										
4										
5										

部门（中心）负责工程师意见： 部门（中心）安全技术室意见： 部门（中心）意见（纸质版盖章）：

附 录 C
(规范性附录)
新线施工现场介入问题汇总表

Q/ZGYY 00 GP 005-03

工程施工现场介入问题汇总表

序号	所属专业	子系统	问题类别	具体地点	存在的问题及建议	检查时间	检查人及联系方式	提报部门	问题归属公司 主管部门	所属标段	问题责任人	整改时限	整改情况	销项人	销项时间	整改进展情况	备注
代码+四位问题号码				车站、车辆段具体区域、主所或区间等	问题描述： 处理建议：	问题提报时间	问题发现人（提供联系方式，最多两人）	按下拉菜单选择	按下拉菜单选择	建设管理部门填写	建设管理部门填写	合理的整改期限	按下拉菜单选择	问题确认关闭人员	完成时间	问题提报更新最新状态	

附 录 A
(规范性附录)
施工现场介入计划

Q/ZGYY 00 GP 005-04


部门（中心）：20 年 月

序号	介入时间	介入范围	主要工作内容	科室	专业小组	介入 人次	调整介入时间	调整原因	备注
合计									

制表人：


部门（中心）
（盖章）

附 录 B
(规范性附录)
新线图纸和资料审核流程

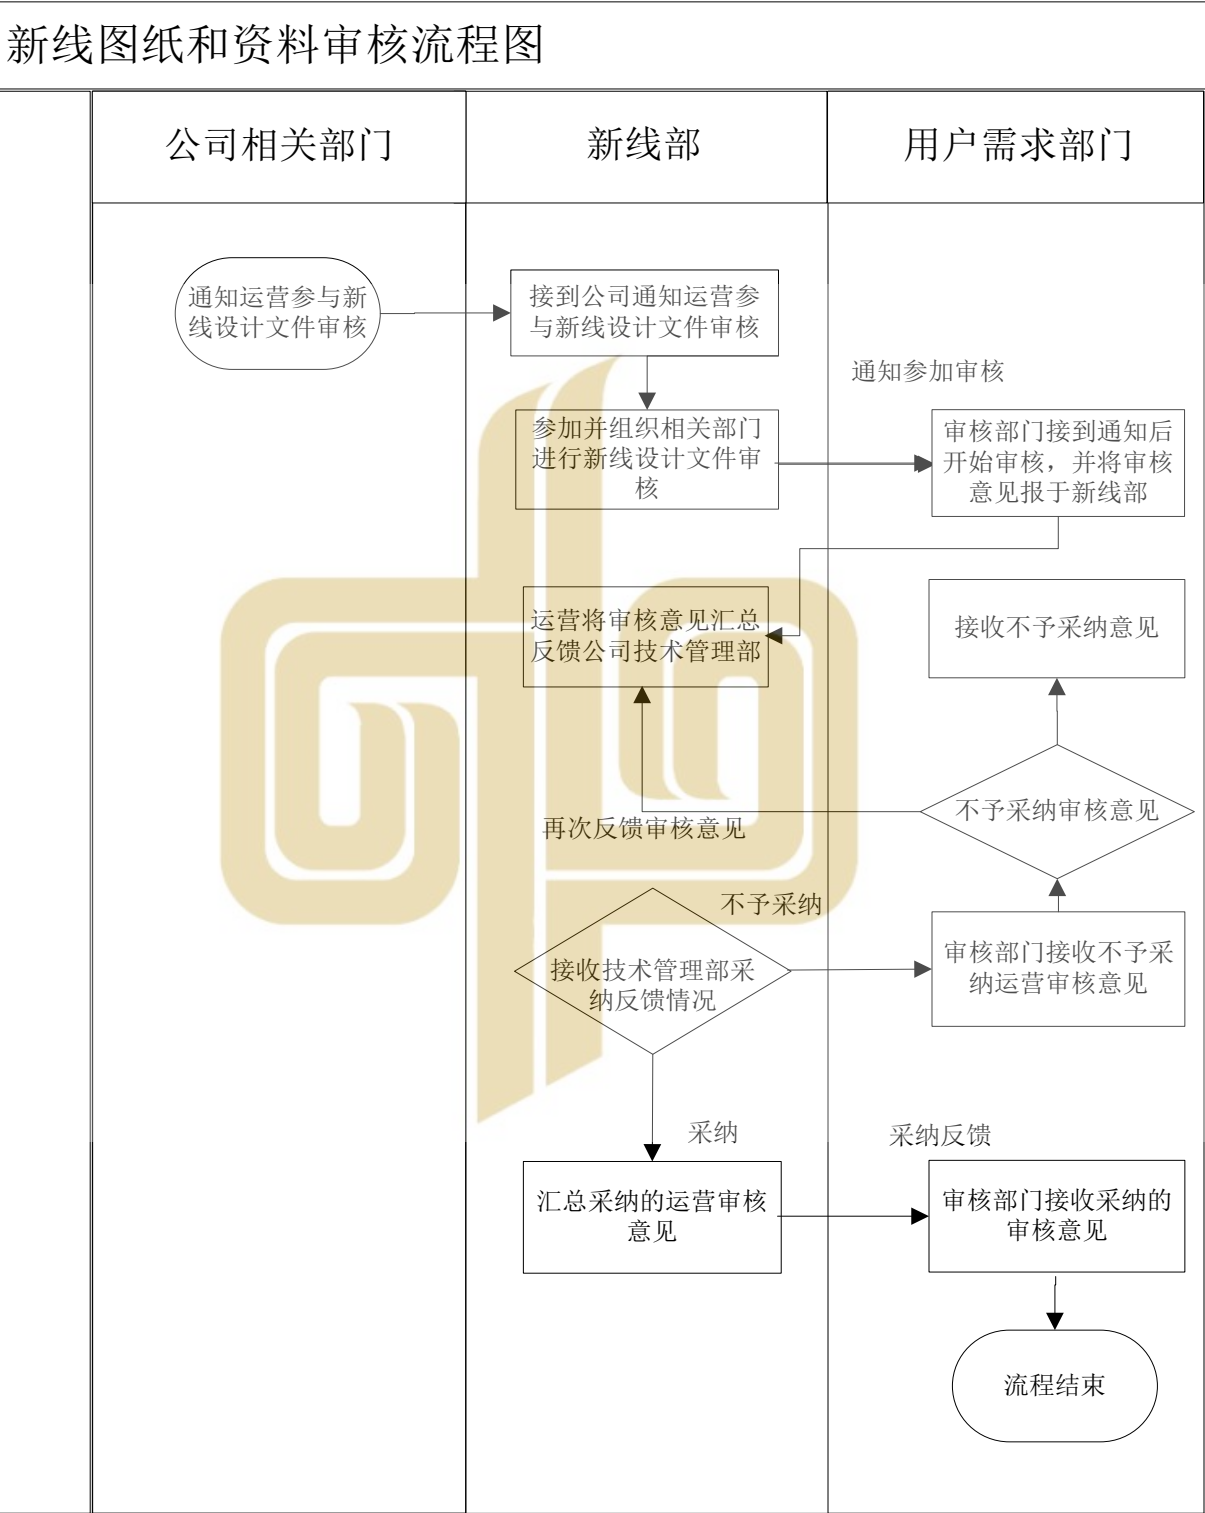

附 录 C
(规范性附录)
新线现场介入流程


Q/ZGYY 00 GP 005-06

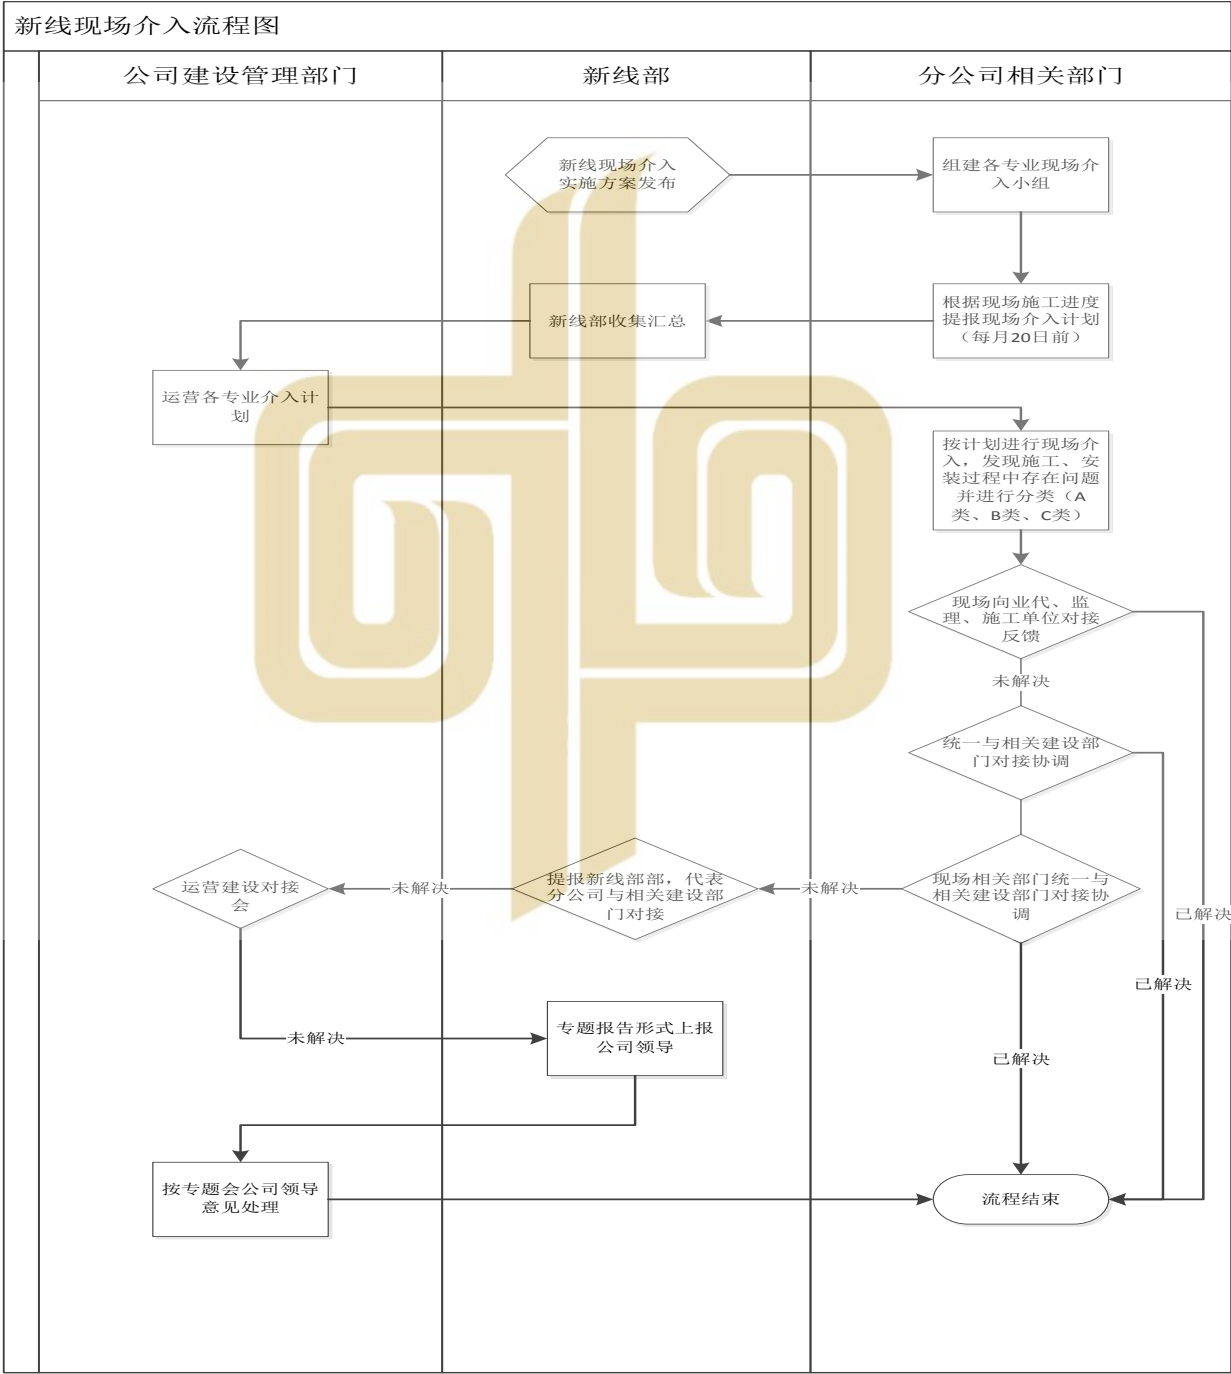

附 录 D
(规范性附录)

新线现场介入需求类问题提报流程

Q/ZGYY 00 GP 005-07

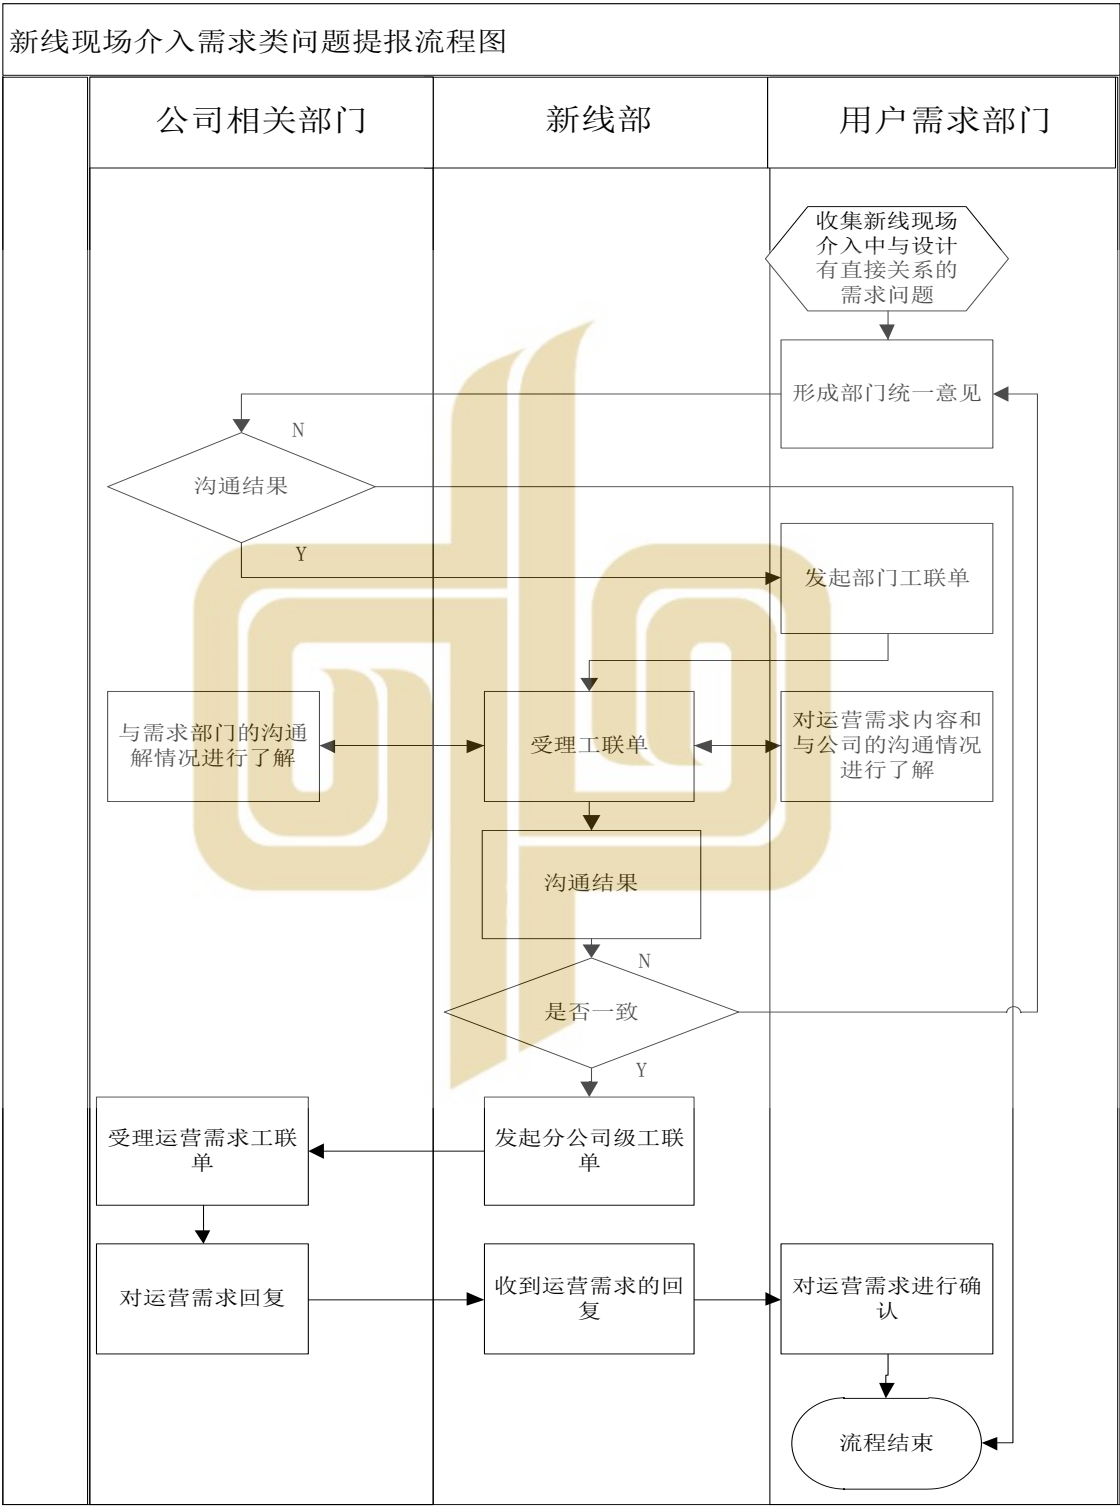

附 录 E
(规范性附录)

新线现场介入需求类问题提报情况说明

需求情况	内容			
	提报依据			
需求部门	需求室意见		需求关联 部门	部门意见，沟通人及联系方式。
	安全技术室			
	部门			
讨论方式	开会讨论，还是私下沟通？			
与公司相关部门的沟通情况	与 XX 部门 XX 工程师沟通；沟通结果；沟通人及联系方式			
与设计单位沟通情况	与 XX 设计单 XX 工程师沟通；沟通结果；沟通人及联系方式			
运营主管领导意见				
